

UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI TURISMULUI



Programul Operațional Regional 2007-2013

Stadiul implementării în Regiunea de Dezvoltare
Centru la 11 martie 2011

Alba Iulia - 17 martie 2011



PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL CENTRU

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Programul Operațional Regional 2007 - 2013

Reprezintă documentul elaborat de statul român, supus aprobării Comisiei Europene, care cuprinde strategia de dezvoltare a regiunilor României, un set de axe prioritare, precum și un mecanism propriu de implementare, care conduce la atingerea obiectivelor Programului.

A fost aprobat și a devenit operațional în 12 iulie 2007.


Cadrul instituțional:

- a fost stabilit prin HG 497/2004, modificată și abrogată prin HG 457/2008
- Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
- Organisme Intermediare - Agențiile pentru Dezvoltare Regională
- Organism decizional - Comitetul de Monitorizare al Programului

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte - proiecte depuse:

Până la 11.03.2011, s-au depus un număr de **1054** proiecte cu o valoare totală a sumei solicitate de **1.064,37** milioane euro



Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte:

- **185 proiecte contractate:** 14 pe DMI 1.1, 13 pe DMI 2.1, 4 pe DMI 3.1, 8 pe DMI 3.2, 1 pe DMI 3.3, 18 pe DMI 3.4, 2 pe DMI 4.1, 108 pe DMI 4.3, 5 pe DMI 5.1 și 12 pe DMI 5.2, având o valoare totală a sumei solicitate de 265,29 milioane euro
- **140 proiecte în fază precontractuală:** 13 pe DMI 1.1, 4 pe DMI 2.1, 2 pe DMI 3.1, 11 pe DMI 3.2, 6 pe DMI 3.4, 6 pe DMI 4.1, 1 pe DMI 4.2, 91 pe DMI 4.3, 2 pe DMI 5.1 și 4 pe DMI 5.2 cu o valoare totală a sumei solicitate de 127,87 milioane euro
- **100 proiecte se află pe lista de rezervă** - 12 pe DMI 2.1, 6 pe DMI 3.1, 7 pe DMI 3.2, 56 pe DMI 3.4, 4 pe DMI 4.1, 15 pe DMI 5.1. Acestea sunt proiecte care nu mai intră la finanțare și care au trecut de evaluarea tehnică și financiară sau conformitate și eligibilitate conform instrucțiunii AMPOR, având o valoare totală a sumei solicitate de 228,17 milioane euro.
- **187 de proiecte** sunt în diferite faze de evaluare și selecție cu o valoare totală a sumei solicitate de 59,71 milioane euro
- **442 proiecte respinse:** 12 pe DMI 1.1, 17 de pe DMI 2.1, 2 de pe DMI 3.1, 19 de pe DMI 3.2, 22 de pe DMI 3.4, 18 de pe DMI 4.1, 1 pe DMI 4.2, 307 de pe DMI 4.3, 10 de pe DMI 5.1, 34 de pe DMI 5.2


Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenție	Suma alocată din POR la nivel regional - inclusiv contribuțiile locale (mil. euro)	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de stat (mil. euro)	Proiecte depuse		Proiecte contractate		Proiecte în faza precontractuală		Proiecte în lista de rezervă		Proiecte rămase în evaluare		Nr. proiecte respinse		Buget rămas (mil. euro)
				Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (4-8-10-12-14)
1	1	151,64	148,61	44	143,95	14	61,43	13	35,14	0	0	5	10,50	12	36,87	65,27
2	PC		74,30	9	28,45	2	5,40	1	5,78			5	10,50	1	6,77	52,62
3	PDU		29,72	8	31,39		0,00	6	17,07			0	0,00	2	14,31	12,65
4	CU		44,58	27	84,11	12	56,03	6	12,29			0	0,00	9	15,79	-23,74
5	2,1	95,56	93,65	46	317,46	13	95,46	4	23,07	12	93,91	0	0,00	17	105,02	-118,79
6	3,1	18,91	18,54	14	31,43	4	3,51	2	18,73	6	7,72	0	0,00	2	1,47	-11,42
7	3,2	10,85	10,63	51	26,98	8	4,48	11	6,01	7	3,30	6	2,35	19	10,85	-5,51
8	3,3	10,85	10,63	1	8,34	1	8,34	0	0,00			0	0,00	0	0,00	2,29
9	3,4	31,06	30,44	104	128,62	18	24,27	6	6,27	56	59,09	2	5,96	22	26,11	-65,15
10	4,1	29,91	29,31	31	123,55	2	14,66	6	16,98	4	15,26	1	5,14	18	64,58	-22,73
11	4,2	25,66	25,15	4	8,46	0	0,00	1	2,54			2	2,45	1	3,47	20,16
12	4,3	31,16	21,81	668	74,00	108	9,24	91	12,95			162	11,27	307	40,54	-11,65
13	5,1	25,66	25,15	33	99,03	5	24,67	2	2,43	15	48,89	1	1,31	10	21,74	-52,15
14	5,2	35,97	25,18	58	102,55	12	19,23	4	3,75	0	0,00	8	20,73	34	58,84	-18,53
TOTAL		467,23	439,09	1054	1.064,37	185	265,29	140	127,87	100	228,17	187	59,71	442	369,49	87,72

Curs infoeuro martie 2011: 1 eur. = 4,2125 lei

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte centralizat:

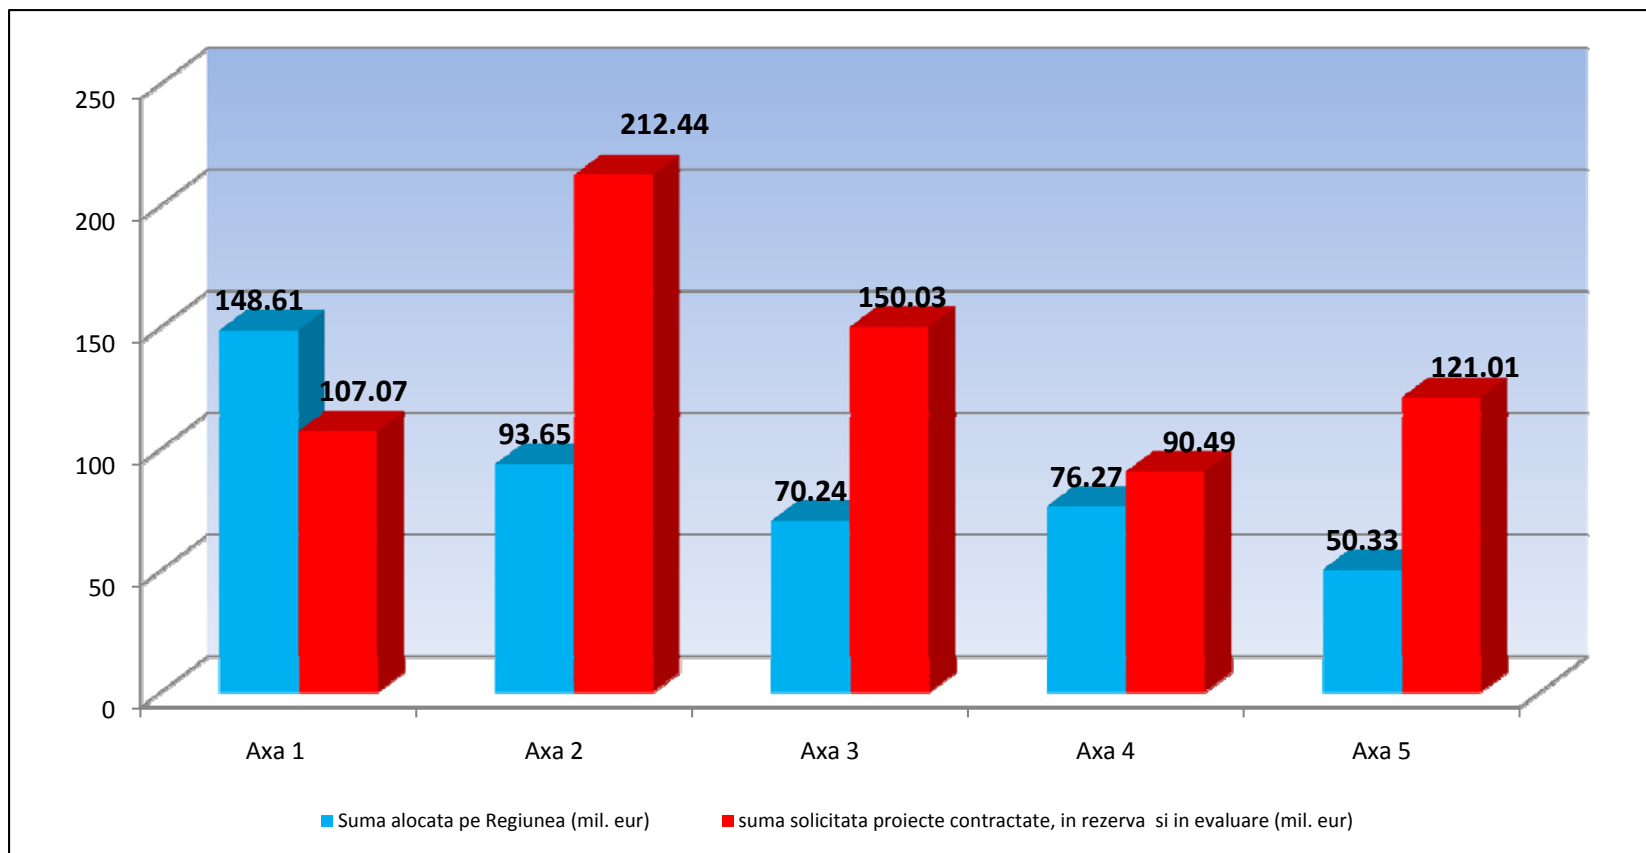

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:

• Centre urbane

- Reprezentate de orașe/municipii cu peste 10.000 de locuitori, altele decât polii de creștere și polii de dezvoltare urbană - 25 în Regiunea Centru

Au fost depuse 9 PIDU-uri (**27 de proiecte individuale**) din care 5 PIDU-uri (9 proiecte individuale) au fost respinse, iar 4 PIDU-uri (**18 proiecte individuale**) - Alba Iulia, Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc și Toplița - au fost evaluate și a rezultat următoarea situație:

- **12** proiecte individuale au fost contractate și au o valoare a sumei solicitate de 56,03 mil. euro
- **6** proiecte se află în fază precontractuală de analiză a PT-urilor și realizare a contractelor de finanțare cu o valoare a sumei solicitate de 12,29 mil. Euro

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:

- **Poli de dezvoltare urbană**

Municipiul Sibiu - PIDU și 3 proiecte individuale cu o valoare a sumei solicitate de 2,00 mil. Euro au fost depuse în data de 02.03.2010 și se află în faza de întocmire a contractului de finanțare. Alte 5 proiecte individuale vor fi depuse 3 în 2011 și 2 în 2012, având o valoare a sumei solicitate de 13,03 mil. Euro.

Municipiul Tg. Mureș - PIDU cu 3 proiecte individuale depuse în data de 05.05.2010, având o valoare totală a sumei solicitate de 15,07 mil. Euro. Proiectele depuse se află 2 în faza de analiză PT și unul în evaluare tehnică și financiară.

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație proiecte Axa prioritară 1:


- **Pol de creștere**

Municipiul Brașov

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru polul de creștere a fost constituită și este funcțională.
- PIDU este finalizat și a fost avizat de AMPOR în cursul lunii decembrie 2009.
- Lista proiectelor a fost modificată în cursul lunii septembrie 2010 și a fost reavizată de CMC prin Decizia nr. 12/12.10.2010.
- Lista proiectelor aferentă axei prioritare 1 a POR include 41 proiecte cu o valoare aproximativă de 150,52 mil. euro. Din cele 41 proiecte individuale aferente axei prioritare 1 a POR, 33 sunt proiecte prioritare care vor fi depuse pentru finanțare pe această axă. Valoarea totală estimativă a acestora este de aproximativ 114,22 mil. Euro. Din cele 33 proiecte prioritare, 8 proiecte au fost depuse depuse până la sfârșitul lunii februarie 2011 cu o valoare totală de 27,94 mil. Euro din care suma solicitată este de 21,68 mil. Euro, iar restul de 25 proiecte vor fi depuse în cursul anului 2011 cu o valoare totală eligibilă de 86,28 mil. Euro
- Din proiectele depuse **2 au fost contractate având o valoare a sumei solicitate de 5,40 mil. euro.**

Dezvoltarea Regiunii Centru prin proiecte finanțate de Programul Operațional Regional 2007-2013

1 decembrie 2010



Legenda

Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbane de creștere

DM 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană

● Poli de creștere

● Poli de dezvoltare urbană

● Centru urban

Axa 2 - Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale

DM 2.1 - Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane-inclusiv construcția / reabilitarea șoselelor de centură

DM 2.1 Sector de drum în reabilitare

DM 2.1 Variantă ocolitoare

DM 2.1 Modernizare străzi

Axa 3 - Îmbunătățirea Infrastructurii sociale

DM 3.1 - Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate

DM 3.2 - Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

DM 3.3 - Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență

DM 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Axa 4 - Sprijinirea mediului de afaceri regional și local

DM 4.1 - Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanță regională și locală

DM 4.2 - Reabilitarea siturilor industriale poluate și neutilizate și pregătirea pentru noi activități

DM 4.3 - Sprijinirea dezvoltării mic întreprinderilor

- Număr de proiecte la nivel de județ

Axa 5 - Dezvoltarea și promovarea turismului

DM 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea / modernizarea infrastructurii conexe

DM 5.2 - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterii calității serviciilor turistice

1, 2, 3 ... 50 - numărul de proiecte/DHI

Rețeaua de așezări urbane

■ reședință de județ

■ municipiu

■ oraș

Infrastructura de transport

— drum european

— drum național

— drum județean

✈ aeroport

Altitudinea (m)

2544


200

— limită de județ

Agnita - denumire de oraș

Jina - denumire de comună

Cloașter - denumire de sat

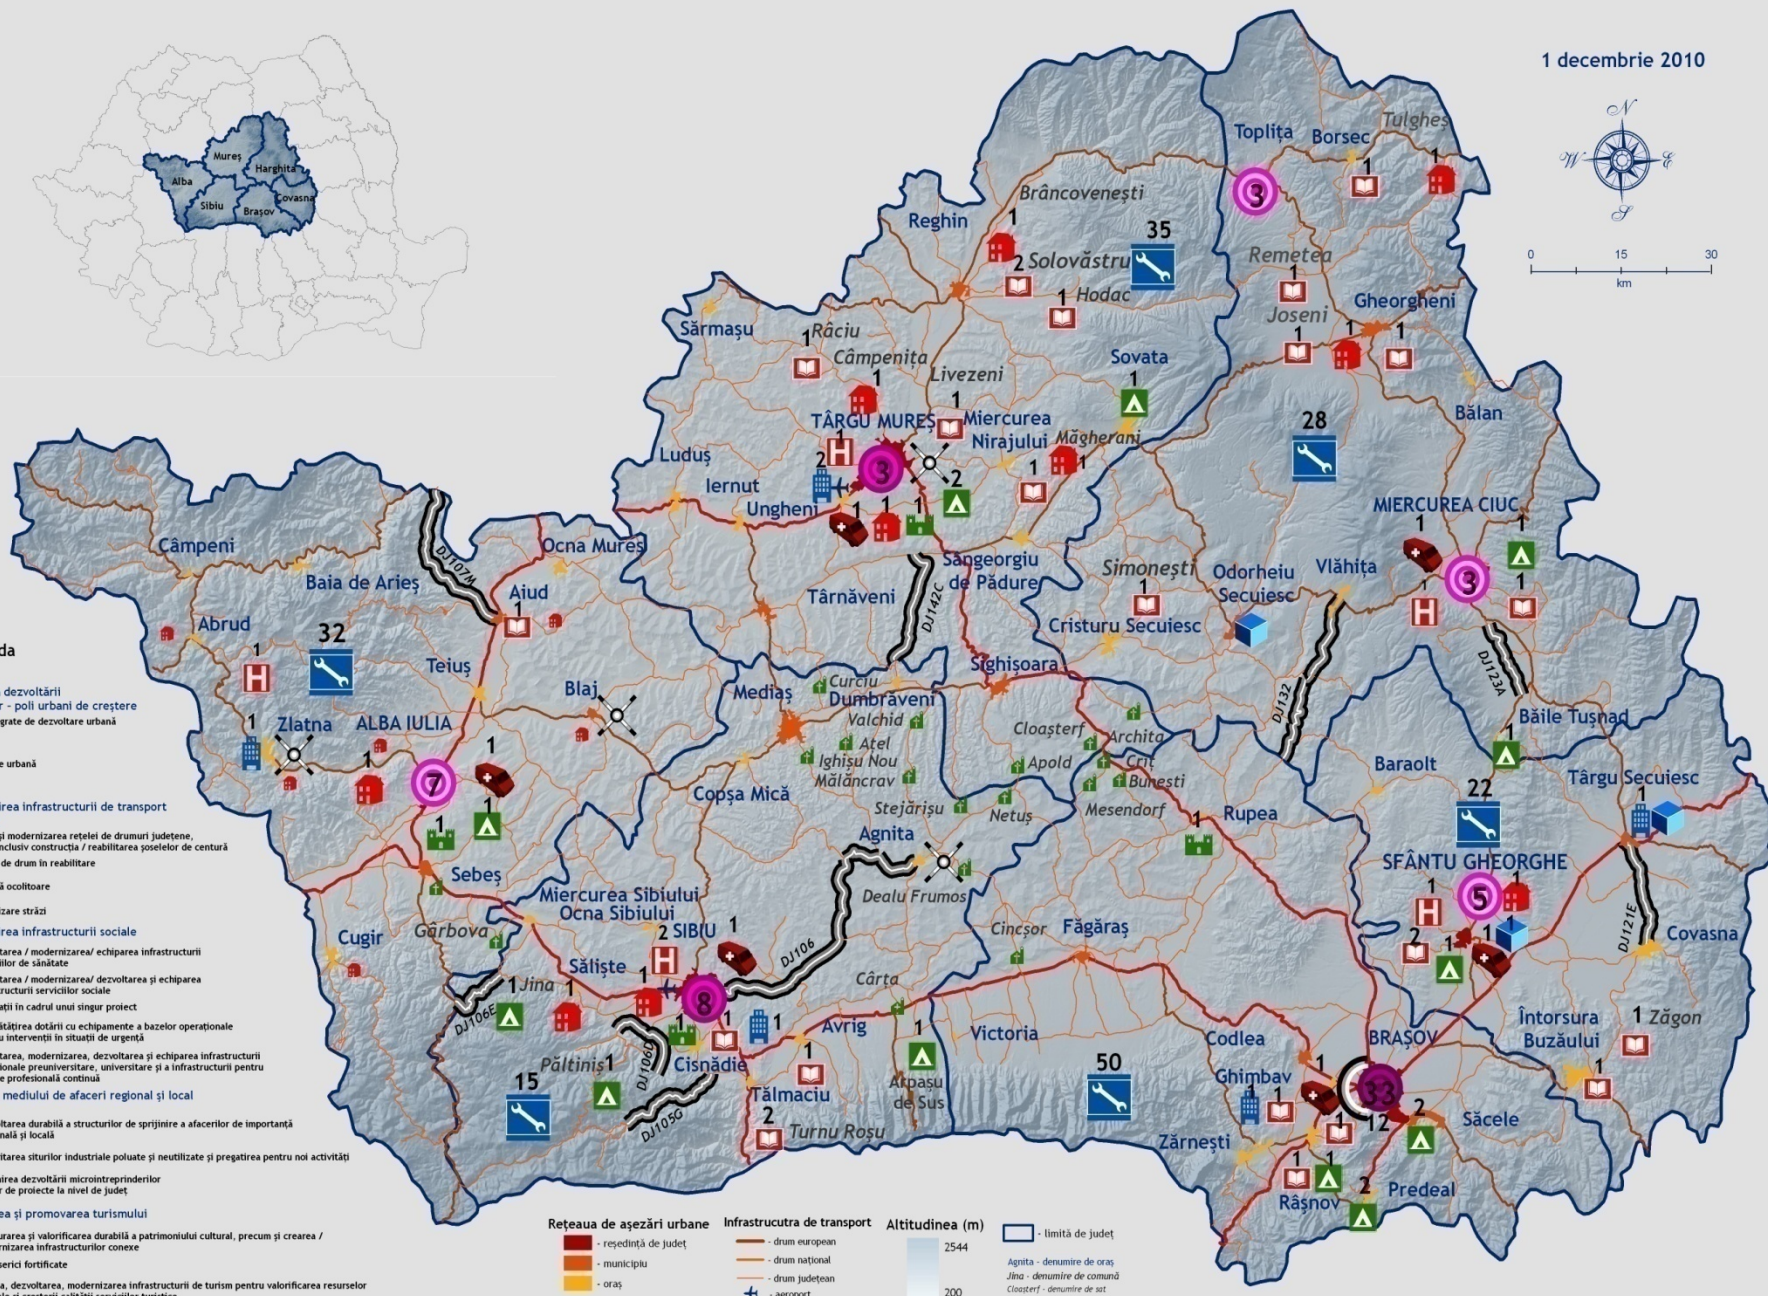

Situație proiecte contractate pe Regio la nivelul Regiunii Centru

Nr. Crt.	Domeniu major de intervenții	Suma alocată din POR la nivel regional - inclusiv contribuție locală (mil. euro)	Suma alocată din POR la nivel regional - FEDR și buget de stat (mil. euro)	Proiecte contractate		Proiecte finalizate		Proiecte reziliate		Cereri de prefinanțare plătite		Cereri de rambursare plătite		Grad de absorbție % 15 (14/4*100)
				Nr. proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma rambursată (mil. euro)	Nr. Proiecte	Suma solicitată (mil. euro)	Nr. Cereri	Valoare cereri de prefinanțare (mil. Euro)	Nr. Cereri	Valoare FEDR+bugetul de stat + pref. dedusă (mil. Euro)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	151,64	148,61	14	61,43					10	8,79	8	0,34	0,23
2	PC		74,30	2	5,40					0	0,00	0	0,00	0,00
3	PDU		29,72		0,00					0	0,00	0	0,00	0,00
4	CU		44,58	12	56,03					10	8,79	8	0,34	0,76
5	2,1	95,56	93,65	13	95,46	1	4,71			23	24,13	39	24,90	26,59
6	3,1	18,91	18,54	4	3,51					6	1,01	2	0,08	0,43
7	3,2	10,85	10,63	8	4,48	1	0,15			8	0,81	11	0,76	7,15
8	3,3	10,85	10,63	1	8,34	1	6,93			1	1,28	3	5,66	53,25
9	3,4	31,06	30,44	18	24,27					18	4,27	11	1,91	6,27
10	4,1	29,91	29,31	2	14,66					0	0,00	5	3,62	12,35
11	4,2	25,66	25,15	0	0,00					0	0,00	0	0,00	0,00
12	4,3	31,16	21,81	108	9,24	44	2,66	22	1,54	2	0,14	90	3,35	15,36
13	5,1	25,66	25,15	5	24,67					7	6,20	9	6,98	27,75
14	5,2	35,97	25,18	12	19,23			1	0,61	3	1,21	22	2,56	10,17
TOTAL		467,23	439,09	185	265,29	47	14,45	23	2,15	78	47,84	200	50,16	11,42

Curs infoeuro martie 2011: 1 eur.= 4,2125 lei

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Prin implementarea celor 185 de proiecte contractate se vor realiza **943 noi locuri de muncă**.

Alți **indicatori** ce vor fi realizați pe Axe prioritare ale POR:

- 201,18 km de drum județean reabilitate / modernizate
- 6,43 km de centură construite
- 38,999 km de străzi urbane vor fi reabilitate

- 1 centru de afaceri construit care să localizeze aprox. 52 de agenți economici
- 88 de microîntreprinderi modernizate care creează 264 noi locuri de muncă

- 4 ambulatorii de specialitate reabilitate
- 5 centre sociale pentru persoane cu dizabilități reabilitate, 4 centre sociale rezidențiale pentru persoane în vârstă și 1 centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică și 1 unitate medico-socială
- 40 de unități mobile echipate pentru intervenții în situații de urgență
- 14 unități de învățământ reabilitate

- 3 cetăți obiectiv de patrimoniu reabilitate și pregătite pentru primirea turiștilor
- 19 biserici fortificate restaurate
- 7 unități de cazare modernizate și structuri de agrement dezvoltate
- 3 puncte salvamont construite și 1 punct salvamont reabilitat
- 1 pârtie de schi construită în lungime de 540 m

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Situație plăți:

La cele 185 de proiecte contractate, până la 01.03.2011:

Au fost plătite **78 cereri de prefinanțare** având o valoare totală de 201.474.716,00 lei (47,83 mil euro)

Au fost depuse **240 cereri de rambursare** în valoare totală de 281.721.491,27 lei (66,88 milioane euro) - 13 pe DMI 1.1, 48 pe DMI 2.1, 5 pe DMI 3.1, 14 pe DMI 3.2, 3 pe DMI 3.3, 19 pe DMI 3.4, 6 pe DMI 4.1, 95 pe DMI 4.3, 11 pe DMI 5.1 și 26 pe DMI 5.2 din care:

❖ **200 cereri de rambursare** au fost plătite de AMPOR având o valoare totală de 242.209.675,14 lei (57,50 mil. euro) din care 211.289.559,30 lei (50,16 mil. euro) din FEDR și bugetul de stat

❖ **20 cereri de rambursare** au fost transmise la AMPOR în valoare totală de 24.579.444,73 lei (5,83 mil. euro).

❖ **20 cereri de rambursare** sunt în verificare la OI în valoare totală de 14.329.206,19 lei (3,40 mil. euro)

Gradul de absorbție al fondurilor alocate la nivelul Regiunii Centru pe Programul Operațional Regional este de **11,42%**, luând în considerare doar valoarea cererilor de rambursare plătite

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Proiecte finalizate:

Până la data prezentei situații **au fost finalizate 47 de proiecte** din care:

- **1 proiect pe DMI 2.1** - Municipiul Brașov - „Varianta de ocolire a municipiului Brasov - faza 1”
- **1 proiect pe DMI 3.2** - Asociației Dr. Carl Wolff a Bisericii Evanghelice C.A. din Romania - „Creșterea eficienței energetice la Căminul pentru persoane vârstnice „Dr. Carl Wolff” din Sibiu prin izolarea termică parțială a clădirii și modernizarea instalației de încălzire a apei menajere”
- **1 proiect pe DMI 3.3** - Asociației de Dezvoltare Intercomunitara "Centrul Transilvaniei" - „Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”
- **44 proiecte pe DMI 4.3** (din domenii: medical, echipamente IT, service auto, inginerie și proiectare, utilaje și echipamente pentru producție și construcții)

Stadiul implementării Regio la nivelul Regiunii Centru

Proiecte finalizate:

Valoare totală proiecte: 142.180.006,09 lei

Suma solicitată (FEDR și BS): 68.015.192,61 lei


Plăți efectuate: 60.891.622,50 lei rambursare (FEDR și BS) și 9.265.151,81 lei (TVA), precum și 5.948.412,57 lei contribuție proprie la cheltuielile eligibile

Indicatori / rezultate:

- ❖ **6,43 km** de centură ocolitoare construiți
- ❖ **1 centru social** rezidențial pentru persoane vârstnice reabilitat
- ❖ **40 unități mobile** pentru intervenții în situații de urgență achiziționate
- ❖ **44 microîntreprinderi** modernizate

201 noi locuri de muncă create



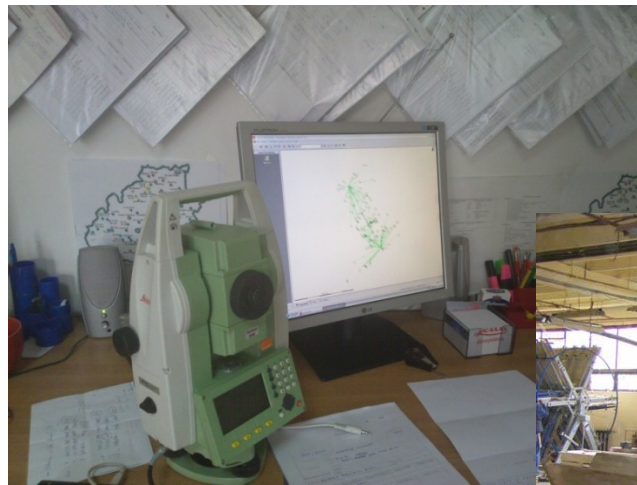

Probleme privind implementarea Regio

1. Modificarea frecventă a graficelor de depunere a cererilor de rambursare în sensul decalării termenelor prevăzute inițial în Cererea de finanțare;
2. Solicitări frecvente de acte adiționale la contractele de finanțare pentru prelungirea perioadei de implementare (DMI 4.3) și solicitarea de încheiere a unor acte adiționale cu nerespectarea prevederilor contractului de finanțare în ce privește termenele de depunere a acestora (30/60 zile înainte de intrarea în vigoare);
3. Expertize tehnice atașate PT-urilor și elaborarea unor documentații de atribuire cu informații tehnice incomplete - neactualizate ce nu sunt în totală concordanță cu situația de pe teren, ceea ce a dus la necesitatea suplimentării valorii lucrărilor de construcție prin încheierea de acte adiționale la contractele existente sau desfășurarea unei noi proceduri de achiziție pe obiecte bine identificate;
4. Situații de calamități (inundații) care au dus la prelungirea termenelor de execuție și modificări ale valorii contractelor de lucrări cu mai mult de 10%;

Probleme privind implementarea Regio

5. Neincluderea în documentația de atribuire, în devizul general al lucrărilor a unei valori de 10% din valoarea lucrărilor pentru acoperirea lucrărilor diverse și neprevăzute, fapt ce a dus la încheierea de acte adiționale de majorare a valorii la contractele de lucrări, acte adiționale care au fost transmise de AMPOR spre avizare la ANRMAP;
6. Suspiciuni de nereguli întâlnite la vizitele în teren pentru verificarea cererilor de rambursare în ceea ce privește achiziția de echipamente (echipamente second-hand, lipsa seriei de identificare) la DMI 4.3;
7. Dificultatea obținerii creditelor necesare pentru plata lucrărilor realizate pentru proiectele care nu au beneficiat de prefinanțare, fapt ce duce la modificarea frecvență a graficului de depunere a cererilor de rambursare, precum și la rezilierea de proiecte în special pe DMI 4.3 (22 contracte reziliate - 29% din proiectele contractate).

Măsuri luate pentru soluționare și prevenirea apariției altor probleme

1. Instrucțiunea 59/18.10.2010 cu privire la rambursarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din Regio care prevede termenele și modalitățile de solicitare a rambursării cheltuielilor.
2. Instrucțiunea 50/25.06.2010 cu privire la decontarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din devizul general al contractelor de lucrări și a actelor adiționale pentru contractele de lucrări/servicii/furnizare finanțate din Regio
3. Transmiterea către beneficiari de scrisori de atenționare privind respectarea prevederilor contractuale în ceea ce privește întocmirea de acte adiționale la contractele de finanțare, activitate urmărită de ofițerii de monitorizare.
4. Întâlniri punctuale între OI, beneficiari și AMPOR pentru discutarea problemelor punctuale.
5. Solicitări de punct de vedere de la AMPOR și ANRMAP.
6. Întâlniri cu beneficiarii după semnarea Contractelor de finanțare în cadrul cărora se analizează bugetul și achizițiile prevăzute, precum și procedurile de implementare a proiectelor.

Măsuri luate pentru soluționare și prevenirea apariției altor probleme

7. Întocmirea și transmiterea către AMPOR a formularelor privind suspiciunea de neregulă - rezultatul fiind neacceptarea decontării cheltuielii efectuate.
8. Organizarea de seminarii cu beneficiarii de contracte de finanțare, în cadrul cărora s-au discutat principalele aspecte de implementare ale proiectelor și problemele întâmpinate și s-au prezentat o serie de soluții de preîntâmpinare sau rezolvare a acestora.
9. Elaborarea unei scrisori și transmiterea acesteia la ANRMAP privind sesizarea unor deficiențe constatate în sistemul de achiziții publice din perspectiva absorbției fondurilor europene.
10. Elaborarea unei scrisori către beneficiarii de proiecte, și publicarea acesteia pe pagina de internet, cu privire la existența unor măsuri de sprijinire a implementării proiectelor finanțate prin Programul Operațional Regional

Măsuri luate pentru soluționare și prevenirea apariției altor probleme

“Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României”, care a fost aprobat prin OUG nr. 9 din 17 feb. 2010 și modificată/completată prin OUG nr. 92 din 13 oct. 2010

- ❖ program guvernamental, cu caracter național, prin care se asigură resurse financiare pentru garantarea împrumuturilor necesare pentru cofinanțarea proiectelor
- ❖ se derulează prin intermediul Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGC IMM)
- ❖ Beneficiarii eligibili: unități administrativ-teritoriale, instituții de învățământ superior de drept public acreditate, instituții de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate, operatori regionali/locali de servicii de alimentare cu apă și canalizare
- ❖ Informații suplimentare: pe pagina de internet a FNGC IMM - <http://www.fngcimm.ro/index.php?page=infrastructura-descrierea-produsului>

Măsuri luate pentru soluționare și prevenirea apariției altor probleme

Hotărârea de Guvern nr. 874 din 18.08.2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice

❖ În cazul contractelor încheiate pentru lucrări de investiții se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului în condițiile și cuantumurile prevăzute în contractele încheiate cu contractorii, cu condiția recuperării din fiecare plată a unei cote-părți cel puțin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia

❖ În Instrucțiunea nr. 59/18.10.2010 privind rambursarea cheltuielilor în cadrul proiectelor finanțate din Programul Operațional Regional, Autoritatea de Management a menționat la punctul 4 că „în cazul în care se acordă avansuri către furnizori/contractori, beneficiarii pot solicita rambursarea valorii acestora“

Măsuri luate pentru soluționare și prevenirea apariției altor probleme

Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și Ordinul nr. 77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii 285/2010

❖ În conformitate cu punctul 5 din Anexa la Ordinul 77/2011, persoanele care desfășoară activități în cadrul unei echipe de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, la clasa de salarizare 70 i se adaugă până la 25 de clase de salarizare suplimentare, stabilite potrivit legii, pe perioada cât își desfășoară activitatea în aceste condiții, proporțional cu timpul de lucru efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect.

UNIUNEA EUROPEANĂ



FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI TURISMULUI



Vă mulțumesc!

Maria Ivan - Director
Departament Organism Intermediar
Agencia pentru Dezvoltare Regională Centru



Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
